

طلب إستلام أعمال

الرقم التسلسلي: 0000

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٥/١٥

المنطقة: جدة

إسم المشروع: مشروع تلال الغروب

الإستشاري: مكتب رمك للاستشارات الهندسية

المقاول: شركة طرق الرياض للمقاولات

MIR Serial Number: كور اسفلت

Date: ٢٠٢٥/٠٥/١٥

Location: جدة

Project Title: مشروع تلال الغروب

Consultant: مكتب رمك للاستشارات الهندسية

Contractor: شركة طرق الرياض للمقاولات

Part A: By the Contractor:

Attachments (tick as appropriate)

☐ Sketch attached to show the location(s) كروي توضيحي للموقع

☐ Approved Shop Drawing الرسومات التنفيذية المعتمدة

☐ Inspection Check list قائمة الفحص

☐ Test Reports (if any) تقارير اختبارات (إن وجدت)

☐ Surveyor Field Sheet (if any) سجل إستلام الأعمال المساحية

☐ Ohtors(state) أخرى

☐ Civil إنشائي

☐ Architectural معماري

☐ Mechanical ميكانيكا

☐ Electrical كهرباء

☐ Other (state) أخرى

Discipline: التصنيف

وصف الأعمال المطلوب تسليمها

Description of Works to be inspected and / or tested:

كور اسفلت/طبقة ثانية

شارع رقم 01

بلوك 10

Works Quantity:

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings

نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب المواصفات العقد وحسب المخططات المعتمدة

Name: الاسم: Signature: التوقيع: Designation: المنصب الوظيفي: Date: 15/05/2025 التاريخ:

Part B: By the Consultant:

ملاحظات القائم بالإستلام

Site Inspector's Comments:

Name: الاسم: Signature: التوقيع: Designation: المنصب الوظيفي: Date: التاريخ:

Witnessed Site Test Results (if any): نتائج اختبارات الموقع (إن وجدت)

☒ Passed مقبول

☐ Failed مرفوض

☐ N/A لا يوجد

Resident Engineer Final Comments & DECISION:

معالجة نتائج اختبار الخرسانة مع لورمانت نتائج الاختبارات

☒ Approved يعتمد

☒ Approved with Comments يعتمد بملاحظات

☐ Comply Comments and Resubmit معالجة الملاحظات وإعادة التقديم

☐ Rejected مرفوض

Name: الاسم: Signature: التوقيع: Date: ٢٠٢٥/٠٥/١٦



Proficiency Laboratory for building materials
Geotechnical studies - Testing Labs for Soil,
Concrete, Asphalt & Construction Materials


شركة مختبر الكفاءة لمواد البناء
لتخصص التربة والأساسات والخرسانة
والأسفلت والمواد الإنشائية

Proficiency Lab

Client	شركة طرق الرياض للمقاولات					Report No.	PRO-240463.113		
Project	مشروع البنية التحتية - مخطط تلال الغروب					Test Date	15-5-2025		
Location	جدة - حي الأمير فواز					Report Date	17-5-2025		
Location	Block 10					Tested By	Saddam		
Description:	BITUMINOUS WEARING COURSE LAYER								
ASPHALT CORES									
Sample No.	STATIONS	Thickness (cm)	Wt. In Air (g)	Wt. In Water (g)	Wt. in SSD (g)	VOLUME (cm³)	Gmb (g/cm³)	Compaction (%)	Required Compaction (%)
1	Street 01 STA. 0 to 264.31	5.3	851.2	500.1	855.3	355.2	2.396	2.589	92.6
2	Street 01 STA. 0 to 264.31	5.4	864.3	510.3	870.5	360.2	2.400	2.589	92.7
3	Street 02 STA. 0 to 264.33	5.6	872.6	513.2	880.3	367.1	2.377	2.587	91.9
4	Street 02 STA. 0 to 264.33	5.1	841.3	498.3	850.3	352	2.390	2.587	92.4
5	Street 03 STA. 0 to 161	5.5	865.5	503.8	868.6	364.8	2.373	2.582	91.9
6	Street 04 STA. 0 to 148	5.6	870.1	506.4	872.2	365.8	2.379	2.582	92.1
						</			



Room 372575 commercial Jeddah, license 142, Commercial Registration 4030391463
Email: lab@proficiencylab.com www.proficiencylab.com Mob.:0552210350
30 St. - Ar Rabwah Dist. - Jeddah - Kingdom of Saudi Arabia

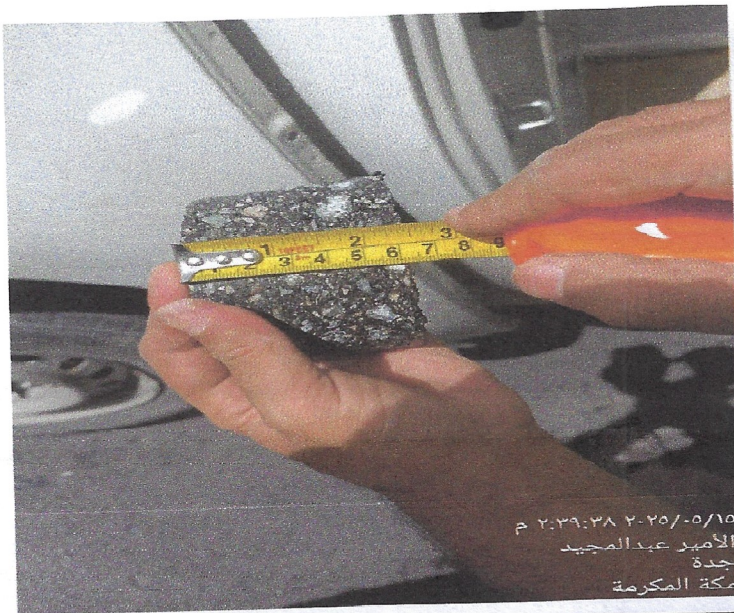

م ٢٠٣٩:٣٨ ٢٠٢٥/٠٥/١٥
حي الأمير عبدالمجيد
جدة
مكة المكرمة



م ٢٠٤٨:٢٣ ٢٠٢٥/٠٥/١٥
3876 الحداب
حي الأمير عبدالمجيد
جدة
مكة المكرمة



م ٢٠٣١:٢٤ ٢٠٢٥/٠٥/١٥
7015 سيد الشهداء
حي الأمير عبدالمجيد
جدة
مكة المكرمة



م ٢٠١٤:١٢ ٢٠٢٥/٠٥/١٥
6819 قلب الجزيرة
حي الأمير عبدالمجيد
جدة
مكة المكرمة



م ٢٠٥٦:١٤ ٢٠٢٥/٠٥/١٥
38 خامس الخلفاء الفرعي
حي الأمير عبدالمجيد
جدة
مكة المكرمة



م ٢٠٥٤:١٢ ٢٠٢٥/٠٥/١٥
3878 Khames Al Khoulaifa
حي الأمير عبدالمجيد
جدة
مكة المكرمة



